

Asse Leader: Programma di Sviluppo Rurale

2007-2013 Regolamento (CE) nr. 1698/2005

Rapporto sull'implementazione del programma Leader nelle Valli di Tures ed Aurina

Situazione al: 31.12.2010



1) L'area di intervento del gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina:

Con delibera della Giunta Provinciale nr. 3684 del 13.10.2008 è stato approvato il piano d'azione locale per le Valli di Tures ed Aurina per i comuni di Gais, Campo Tures, Selva di Molini e Predoi.

L'area in questione ha un'estensione di 629 m² e comprende complessivamente 15.352 cittadini (dato riferito al 2001). Si tratta nella fattispecie di un'area relativamente periferica, ma caratterizzata da una certa unità. Da alcuni anni i comuni periferici registrano una leggera tendenza migratoria dalle campagne, per cui si sono resi necessari interventi di stabilizzazione, così come previsto dai provvedimenti di sostegno Leader.

2) Il gruppo d'azione Valli di Tures ed Aurina:

Il gruppo d'azione Valli di Tures ed Aurina è stato istituito in seguito a delibera nr. 180/BA del 19.06.2008 della Comunità Comprensoriale della Val Pusteria. Tale gruppo è formato da 13 membri, di cui 6 in rappresentanza di istituzioni pubbliche (comuni) e 7 provenienti dall'ambito privato.

I membri del gruppo d'azione locale al 31.12.2010 sono:

Nome	Membro	Nome	Membro
Presidente del GAL Sindaco Helmuth Innerbichler (Comune di Campo Tures)	Pubblico	Steiner Gebhard (agricoltura)	Non pubblico
Vice-Presidente del GAL Sindaco Helmut Klammer (Comune della Valle Aurina)	Pubblico	Fuchsbrugger Meinhard (Turismo/Funivie)	Non pubblico
Sindaco dr.ssa Romana Stifter (Comune di Gais)	Pubblico	Auer Stefan (Associazione turistica dell'area vacanze Valle di Tures ed Aurina)	Non pubblico
Sindaco Robert Alexander Steger (Comune di Predoi)	Pubblico	Dr. Stefan Steinhauser (Cultura)	Non pubblico
Sindaco Paul Niederbrunner (Comune di Selva di Molini)	Pubblico	Innerbichler Helmuth (Economia)	Non pubblico
Assessore Günther Oberhollenzer (Comune della Valle Aurina)	Pubblico	Pircher Martin (Economia/commercianti)	Non pubblico
Steger Paul (Agricoltura)	Non pubblico		

Il gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina si è incontrato in **4 sedute nell'arco del 2010. Queste si sono svolte in data 23.03.2010, 15.07.2010, 19.10.2010 e 02.12.2010.** In queste sedute si è discusso e deliberato sull'implementazione del programma e sulle misure da prevedere per la sua attuazione. In particolar modo è stata/o:

- discussa la progettazione e lo sviluppo operativo dei progetti, così come previsto dal piano di sviluppo locale. In questo modo il gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina ha dato il via alla realizzazione operativa del programma Leader 2007-2013;
- discussa, deliberata ed affidata l'esecuzione di una serie di progetti, delegandone l'esecuzione, come elencato dal sommario allegato;
- accettato il rapporto dei coordinatori dr. Helmuth Pinggera e della dr.ssa Miriam Rieder, esaminato in generale lo stato dell'esecuzione dei progetti e determinate le fondamentali linee strategiche di sviluppo.

I verbali delle riunioni tenutesi dal gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina danno un resoconto dettagliato sui contenuti discussi e decisi nelle suddette sedute.

3) Deleghe:

Nell'arco dell'anno d'azione 2010 è proseguito con sistematicità il lavoro finalizzato all'attuazione delle misure previste nel piano di sviluppo locale ed all'implementazione degli ambiti d'azione individuati nello stesso.

Basandosi sullo stato intermedio dei progetti, riferito dai coordinatori durante la seduta svoltasi il 19.12.2009, sono state eseguite nell'arco del 2010 diverse sedute con i promotori dei progetti. Queste hanno avuto come contenuto la concreta realizzazione dei progetti già decisi e delegati. In prima linea si è trattato lo sviluppo, la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione dei progetti. In tale contesto sono stati definiti anche i procedimenti tecnico-amministrativi, nonché concretizzati gli svolgimenti finanziari dei progetti.



LAG Taufere Ahrntal

Stato attuale delle realizzazioni del GAL Valle di Tures ed Aurina al 31.12.2010:

	Progetti delegati	%	Progetto completo
Somma lorda	2.788.878,00 €	44 %	6.334.000,00 €
di cui contributo pubblico	2.205.852,00 €	43 %	5.165.000,00 €

La lista dei progetti delegati si è potuta ampliare a 22.

Lista dei progetti attualmente delegati:

Nr.	Nr. prog.	Titolo	Provv.	Promotore	Costi del progetto	% finanziamenti	Contributo finanziato	Data delibera decretante
1	001	M431/2008: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (M431/2008)	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	78.000,00 €	100	78.000,00 €	Nr. 525 del 10.07.2009
2	002	M431/2009: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (M431/2009)	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	100	100.000,00 €	Nr. 772 del 02.11.2009
3	003	M313B: provvedimenti per il miglioramento delle malghe presso Neves a Lappago	313B	Comune di Selva di Molini	349.996,00 €	70	244.997,20 €	Nr. 1.000/3.2 del 11.12.2009

4	004	M313C: Antica cultura popolare e tradizioni nell'anno contadino della Valle Aurina (M313C/calendario contadino)	313C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	15.000,00 €	80	12.000,00 €	Nr. 910 del 22.12.2009
5	005	M313C: programma di intrattenimento per ospiti di Predoi – Casere	313C	Associazione Turistica Valle Aurina	_____ €	80	_____ €	Ritirato
6	006	M322: Allestimento centro paesano di Caminata	322	Comune di Borgata di Campo Tures	375.000,00 €	80	300.000,00 €	
7	007	M322: Allestimento piazza del paese di S. Giacomo	322	Comune di Valle Aurina	180.000,00 €	80	144.000,00 €	
8	008	Festival del formaggio 2010	313C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	80	80.000,00 €	Nr. 95 del 09.03.2010
9	009	Rinnovo paesano di S. Pietro	322	Comune di Valle Aurina	195.000,00 €	80	156.000,00 €	Nr. 135 del 18.03.2010

10	010	Sentiero "SunnSAT" progetto complessivo e lotto edilizio 2010	313A	Comune di Valle Aurina	62.500,00 €	70	43.750,00 €	Nr. 169/32.2 del 24.03.2010
11	011	Sentieri di confine "Predoi/Casere"	313A	Ente per il Parco naturale / Comune di Predoi	_____€	70	_____€	Stornato
11	011	Sentieri di confine "Predoi/Casere"	313A	Provincia Autonoma di Bolzano / Ispettorato forestale di Brunico	200.000,00 €	80	160.000,00 €	Nuovo progetto inoltrato
12	012	Mondo contadino e mondo dell'acqua – Valle di Selva di Molini	313 C	Associazione Turistica di Selva di Molini	250.000,00 €	80	200.000,00 €	Nr. 95 del 09.03.2010
13	013	Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2010	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	10.550,00 €	80	8.440,00 €	Nr. 95 del 09.03.2010
14	014	Sentieri del sole della Valle Aurina –	313 C	Associazione Turistica della Valle Aurina	120.850,00 €	80	96.680,00 €	Nr. 95 del

		sviluppo progetto 2010						09.03.2010
15	015	“Camminerai per 7 sentieri” sentieri a tema a Campo Tures programma complessivo	313 A	Comune di Borgata di Campo Tures	307.500,00 €	70	215.250,00 €	Nr. 168/32.2 del 24.03.2010
16	016	M431/2010: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00	100	100.000,00 €	Nr. 574/31.6 del 23.08.2010
17	017	Programma di animazione per bambini per l'estate nella Valle di Tures ed Aurina	313 C	Lega turistica della regione vacanze della Valle di Tures ed Aurina	151.700,00 €	80	121.360,00 €	Nr. 682 del 22.10.2010
18	018	Pista ciclabile per famiglie “Martin Pescatore” di Gais	313 A	Comune di Gais	_____€	80	_____€	
19	019	Sentieri “SunnSAT” 2° lotto	313 A	Comune di Valle Aurina	88.500,00 €	70	61.950,00 €	

20	020	Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2011	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	9.282,00 €	80	7.425,60 €	
21	021	Marca: “Regione Valle di Tures ed Aurina”	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	95.000,00 €	80	76.000,00 €	
		Complessivo			2.788.878,00 €		2.205.852,80 €	

4) Realizzazione operativa: rapporto delle attività 2010 e previsione delle attività 2011:

Il rapporto delle attività 2010 e la previsione dei lavori per il 2011 sono stati presentati dai coordinatori al gruppo d’azione locale delle Valli di Tures ed Aurina in data 02.12.2010. La documentazione è stata valutata positivamente da parte del GAL Valli di Tures ed Aurina e quindi approvata. Il documento è strutturato in aree geografiche di intervento allo scopo di rendere maggiormente riconoscibile l’operatività del progetto. Esso comprende anche lo stato attuale dei progetti ed i provvedimenti ancora da porre in essere.

		Progetto	Finanziamento lordo (100%)	Promotore	= dettagli attuali	stato
	Parola chiave: Agricoltura					
1	Produzione di formaggio grigio	Viene realizzato tramite M111 e la scuola professionale per l'economia domestica di Teodone -				da trasferire
2	Coltivazione di erbe	Ritirato a causa della scarsa partecipazione				da trasferire
3	Biogas	Progetto pilota per l'utilizzo e l'ottimizzazione della produzione di biogas	625.000 €	da definire		
	Area comunale della Valle Aurina					

4	Rinnovo paesano località S. Giacomo	Provvedimento per l'allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	180.000,00 €	Comune di Valle Aurina	= chiarimenti con l'ente dei beni culturali	in realizzazione
5	Rinnovo paesano località S. Pietro	Provvedimento per l'allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	195.000,00 €	Comune di Valle Aurina		in realizzazione
6	Sentieri del sole della Valle Aurina – sviluppo progetto 2010 – 2011	Diversi provvedimenti sullo sviluppo progettuale concentrati sull'aspetto del marketing, della comunicazione, dello sfruttamento dei sentieri e dell'allestimento degli stessi.	120.850,00 €	Associazione turistica Valle Aurina – gruppo sentieri della Valle Aurina	= 2011: vedi programmazione dei provvedimenti con G. Strauss ed altri = Logo / grafica / insegna presso i masi = 1° foto / insegne / testi di Mersi = Presentazione internet = gruppo attività	in realizzazione

					lungo il sentiero, piano marketing = installazione lungo i sentieri / manifestazioni + installazioni per bambini = laboratorio di intaglio 2011 = Predoi / serie di foto / logo = pianificazione progetto successore / richiesta inoltrata al GAL	
7	Sentiero “Sunnas” della	Lotto edile 2010 delegato ed in realizzazione	62.500,00 €	Comune di Valle Aurina – Weger Wolfgang	= circa il 20% del lotto edile realizzato	Inizio operativo

	Valle Aurina			ispettorato forestale e Günther Oberhollenzer, comune di Valle Aurina	nel 2010 / il resto nel conclusione lavori nel 2011 = chiarimenti per il finanziamento direttamente con l'ente provinciale per l'economia di montagna nella persona di M. Zöschg.	avvenuto solo nell'ottobre del 2010.
8	Sentieri del sole della Valle Aurina – lotto edile 2011	Conclusione sentiero “Sunnat” – 2° lotto edile tra Cadipietra e S. Pietro in Valle Aurina.	88.500,00 €	Comune di Valle Aurina – Weger Wolfgang ispettorato forestale e Günther Oberhollenzer, comune di Valle Aurina	Conclusione sentiero “Sunnat” –previsto a S. Pietro nel 2011.	in realizzazione
9	Sentieri del sole della Valle	Giro delle malghe, unità di intrattenimento, allacci, tavoli ed	310.000,00 €	Associazione turistica Valle Aurina per la Valle	= i progetti sono da	da progettare

	Aurina – lotto edile 2012	insegne.		Aurina e Predoi	presentare	
10	Antica cultura popolare e tradizione – calendari	Documentazione sulla vita contadina in Valle Aurina	15.000 €	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale in Valle di Tures ed Aurina	= concluso nel 2009	realizzato
11	Provvedimenti marketing per i sentieri del sole 2011	Immagini, grandi stampe, insegne e prodotti tipografici per il posizionamento dei sentieri del sole della Valle Aurina	90.000,00 €	Associazione turistica Valle Aurina	= il progetto è stato sviluppato in forma grezza e sarà concluso definitivamente prima della chiusura del marketing ATSW 2010 = da prevedere come proseguo della seduta Arge sentieri	in preparazione

					del sole.	
12	Marketing “Sentieri del sole / Terra Ospitale” 2012/2013	Provvedimenti di marketing per i sentieri del sole della Valle Aurina ed i sentieri di confine di Predoi sulla base del marketing 2011 e nella rete Terra Ospitale Valle di Tures ed Aurina. Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei piaceri”	180.000,00 €	Associazione Valle di Tures ed Aurina		in progettazione
	Area comunale di Gais					
13	Sentiero del Martin Pescatore – isole fluviali dell’Aurino – Gais	Provvedimenti edili e di allestimento lungo il sentiero escursionistico per famiglie	351.428,57 € / di cui 246.000 € di contributo	Comune di Gais	= antico piazzale della chiesa (angolo Pitziger, via Kehlburg, via Ulrich von Taufers, incrocio Windschar, padiglione, strada Talfrieden, attraversamento	Volgger/18.1. 211 Incaricato del progetto ing. Bellutti; Progetto ridotto a Villa

					Baggalocke, Villaottone, incrocio via Einsberg Villa Ottone, allestimento paesaggistico e piattaforma panoramica	Ottone Prossima settimana circa in commissione edile
14	Rinnovo paesano del Comune di Gais	Provvedimento per l'allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	375.000,00 € / 300.000,00 € contributo pubblico	Comune di Gais	= prima escursione / colloquio di progettazione con il comune, assegnazione per la preparazione di proposte disegnate, schizzi, risultati da presentare entro il 28/02/2011: inoltre del progetto	Volgger / 18.1.211: primi colloqui con l'arch. Colcuc in dicembre, disdetta; ing. Brunetti prende in mano la progettazione

						insieme ad un architetto; presentazione entro fine febbraio 2011;
15	Provvedimenti di marketing per la pista ciclabile del Martin Pescatore	Provvedimenti di comunicazione Martin Pescatore – pista ciclabile Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei piaceri”	100.000,00 €	Comune di Gais in sinergia con le associazioni turistiche	= i provvedimenti di comunicazione saranno definiti in seguito ai provvedimenti di allestimento / previsto allaccio centro di mobilità di Brunico – Cascade Campo Tures	da progettare
	Area comunale di Predoi					

16	Sentieri a tema di Predoi – sentieri di confine Predoi – Casere	Provvedimenti di miglioramento ai sentieri tematici di Predoi – miniera e altri giri escursionistici nel Parco naturale delle Vedrette di Ries – Aurina	200.000,00 €	Ispettorato forestale di Brunico su incarico dell'ente per i parchi naturali (Brunico) e del comune di Predoi	= lotto edile miniera di S. Cristoforo con accesso alla piattaforma Rödwaterfall conclusa / sentiero dell'antico condotto d'acqua di raccordo con la miniera di Nikolaus quasi concluso / sentiero didattico S. Rebecca nelle vicinanze di Casere quasi finito nel 2001: copertura miniera Johannes – Rödkreuz e Hundskeljoch – Casere/S. Spirito nel 2012 secondo	in realizzazione
----	---	---	--------------	---	--	------------------

					progetto.	
17	Mezzi liberi – sentieri a tema di Predoi	Da definire attraverso il comune di Predoi	40.000 € contributo pubblico			aperto
18	Rinnovo paesano di Predoi	Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	375.000 / 300.000 € contributo pubblico	Comune di Predoi	= parti del progetto complessivo concordate con il sindaco il 01/07/2010; inoltre del progetto ancora da effettuare, da presentarsi entro il 28/02/2011	in progettazione
19	Predoi - paese della salute	Nelle sedute del 17/08/2010 – 30/08/2010 – 08/10/2010 è stato elaborato insieme al comune il progetto di base per “Predoi – paese in salute”.	Finanziamento non tramite Leader TAT	Comune di Predoi	= richiesta FSE per lo sviluppo di prodotti inoltrata = certificazione /	progetto depositato

					marketing dovrà confluire nel progetto Interreg "Regione della salute TAT" = incontri tramite Leader	
20	Profilo estivo del turismo di Predoi	Progetto per un posizionamento professionale del turismo estivo per Predoi (in seguito a colloquio con il sindaco Steger) – sviluppo e progettazione della documentazione del 26/10/2010 consegnato al comune	Realizzazione tramite AT "Sentieri del sole" / Marketing	Comune di Predoi / Gruppo turismo di Predoi	= progetto depositato / ulteriori colloqui per il 12/2010 su invito del comune / programma per il 2011.	progetto depositato
21	Comunicazione /marketing per Predoi e sentieri	La comunicazione ed il marketing per i sentieri di confine e per Predoi saranno realizzati nell'ambito del progetto "Sentieri del sole" dell'associazione turistica Valle Aurina.	Finanziamento tramite il progetto "Sentieri del	Associazione turistica Valle Aurina	= nel 2010 realizzato piccolo progetto escursionistico / stampa "Predoi in 7	progetto depositato

	di confine	Elemento "Terra Ospitale – regione dell'avventura – paese dei piaceri"	sole della Valle Aurina" (marketing)		immagini" ancora aperto = da progettare nell'ambito dell' ATSW	
	Area comunale di Selva di Molini					
22	Rinnovo paesano di Selva di Molini / Lappago	Provvedimento per l'allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	375.000,00 €	Comune di Selva di Molini, vicesindaco Waltraud Aschbacher e Sindaco Paul Niederbrunner	= in progettazione con ufficio di progettazione / visita in loco il 19/11/2010 / 5 blocchi a tema / progettazione entro il 28/02/2011	in progettazione
23	Risanamento	Spostamento della malga, nuova costruzione e preparazione	349.996,00 €	Comune di Selva di	= festa del tetto svoltasi il 22/10/2010	In costruzione

	malga Neves	pascolo		Molini / Steiner Gebhard	/ conclusione dei lavori nell'estate 2011 / provvedimenti di allestimento a Neves attraverso il progetto DE Selva di Molini / progetto ambientale	
24	Mondo dell'acqua – Selva di Molini / Lappago	Mostra e provvedimenti per lo sfruttamento turistico e la riqualifica di Selva di Molini / Lappago Folder / manifestazioni / inserzioni / pubblicità / ufficio turistico / associazione turistica / marketing per la Valle di Selva di Molini Elemento "Terra Ospitale – regione dell'avventura – paese dei piaceri"	250.000,00 €, nel 2010,2011,2012 ,2013	Associazione turistica di Selva di Molini – Lappago, Brunhilde Niederwieser e Marcher	= valutazione nell'anno 2010 eseguita il 18.10.2010 e progetto operativo il 2011 attualmente discusso in diverse sedute, piano per il 2011 pronto entro il 20.12.2010	In realizzazione

	Area comunale di Campo Tures					
25	“Camminerai per 7 sentieri” – sentieri a tema Campo Tures / Acereto / Riva di Tures / colle Waldburg.	Miglioramento dei sentieri a tema nell’area del comune di Campo Tures seguendo un concept di base.	307.500,00 €	Comune di Campo Tures / Dr. Moling, Ispettorato forestale di Brunico e comune di Campo Tures	= progetto partito nel 2010 – a circa il 30% della realizzazione; check del progetto con gli assessori Bacher Andreas e Mair Wolfgang; piano dettagliato consegnato con Moling dell’ispettorato forestale, Andreas Bacher ha realizzato le ultime forme. = da chiarire riqualifica antico	in realizzazione

					sentiero della chiesa di Riva di Tures grazie all'appoggio del CP Berger = da chiarire il bando sui sentieri a tema Molini di Tures / colle Waldburg.	
26	Rinnovo paesano della località di Caminata – comune di Campo Tures	Provvedimento per l'allestimento paesano in concomitanza con il turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.	375.000/300.000 € di contributo pubblico	Comune di Campo Tures – assessore dr. Günther Fröh	= bando a 5 progettisti / offerte e scelta / in seguito progettazione e approvazione / realizzazione a partire dalla primavera del 2011 e conclusione entro il 2011	in progettazione

27	Marketing "TO Camminerai per 7 sentieri" – sentiero a tema Campo Tures	Provvedimenti marketing per i sentieri a tema Campo Tures Elemento "Terra Ospitale – regione dell'avventura – paese dei piaceri"	100.000 €	Associazione turistica Campo Tures		in progettazione
	Qualità nel turismo – regione vacanze incentrata su "Terra ospitale / regione del buon gusto Slow Food Valli di Tures ed Aurina					
28	Festival del formaggio	Realizzazione della manifestazione "Festival del formaggio" con presidio Slow Food per il formaggio grigio e altri prodotti di qualità dall'area delle Valli di Tures ed Aurina	80.000 € di contributo pubblico	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli	= manifestazione 2010 eseguita con successo, documentazione	realizzato

				di Tures ed Aurina / Pircher Martin	reperibile	
29	I contadini nani	Programma di intrattenimento per bambini per la regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina con riferimento alla cultura contadina della regione, la natura e lo spettacolo della natura. Elemento "Terra Ospitale – regione dell'avventura – paese dei piaceri"	151.700 € lordi	Regione vacanze Valle di Tures ed Aurina / GF Stefan Auer	= eseguito nel 2010 con la partecipazione di 1259 bambini / 160 aziende della Valle di Tures ed Aurina ne hanno usufruito / programma 2011 in preparazione.	2010 realizzato 2011 in progettazione
30	Masi attivi della Valle Aurina	Progetto di cooperazione di 9 aziende di agriturismo con i contenuti di qualificazione e marketing	41.000 € per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale della Valle di Tures ed Aurina / Miriam Rieder		2010 realizzato

31	Sviluppo marchio “Regione dei piaceri / terra ospitale”	Apparizione per l’area della Valle di Tures ed Aurina con integrazione dei marchi preesistenti e confluenza degli stessi / definizione dell’identità e della qualità Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei piaceri”	95.000 €	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina	= team del progetto da creare / realizzazione da iniziare / termine per la conclusione da concordare	in progettazione
32	Marketing “Terra ospitale” – regione dei piaceri – Slow Food Valle di Tures ed Aurina	Sviluppo e comunicazione per la “Regione dei piaceri Valli di Tures ed Aurina” come tema centrale nella rete regione vacanze – associazioni turistiche – aziende e comuni	250.000 €	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina / Helmuth Pinggera	= il gruppo per il progetto è attualmente in formazione / progetto di 9 gruppi Leader in Italia / se non fattibile entro l’anno possibile iniziativa autonoma tra il Leader VTA e Leader Val d’Ultimo - DNB – Val Martello	in progettazione

33	Festival del formaggio 2012	Festival del formaggio con tema centrale incentrato su “Terra ospitale – regione Slow Food Valle di Tures ed Aurina” come rete di sentieri a tema e prodotti regionali, nonché vendita gastronomica di prodotti di qualità Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei piaceri”	80.000 €	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina	= da progettare con la presentazione di “Terra ospitale – regione dell’avventura – paese del piacere”	in progettazione
34	421 progetto di cooperazione infraterritoriale	Per la realizzazione di questi progetti si necessita di almeno due gruppi d’azione locali cooperanti				
35	Terra Ospitale – Valle di Tures ed Aurina	- progetto network con almeno 8 GAL sotto la gestione strategica di Slow Food Italia – progetto network	50.000,00 €	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale della Valle di Tures ed Aurina	= le sedute preparatorie si sono svolte nel 2010 / l’ultima il 09/07/2010 a Roma ed il 29/03/2011 in Piemonte; da ora il gruppo dovrebbe	in progettazione

					essere al completo. = cooperazione alternativa tra due GAL altoatesini oppure altre soluzioni	
36	Agenda 21 – Comuni delle Valli di Tures ed Aurina	Progetto Network con GAL di Val d’Ultimo/Deutschnonsberg/Val Martello per lo sviluppo di progetti sostenibili nell’ambito della strategia Agenda 21	50.000,00 €	Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina	= progetto da sviluppare – si intende incentivare la cooperazione con GAL austriaci	in progettazione
37	431 Amministrazione e gruppi d’azione locali	Organizzazione e coordinamento del piano d’azione locale delle Valli di Tures ed Aurina		Cooperazione per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina	= 2009 - 2013	in corso

38		Anno 2008	78.000 €	Coop.S.F. VTA		realizzato e liquidato
39		Anno 2009	100.000 €	Coop.S.F. VTA		realizzato
40		Anno 2010	100.000 €	Coop.S.F. VTA		realizzato
41		Anno 2011	100.000 €	Coop.S.F. VTA		richiesto

5) Punti critici nella realizzazione del piano d'azione locale:

Il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina ha immediatamente iniziato con la realizzazione del piano d'azione in seguito all'approvazione dello stesso tramite la giunta provinciale per l'area oggetto dei provvedimenti di sostegno nelle Valli di Tures ed Aurina. Il GAL Valli di Tures ed Aurina si incontra in sedute che si svolgono regolarmente, in cui vengono discussi e valutati i progetti inoltrati prima della loro delega per la realizzazione. Lo stato delle deleghe progettuali dimostra che il lavoro di programmazione avanza con una certa celerità ed in coerenza con le linee su cui si incentra il sostegno Leader e il piano d'azione locale. A tale riguardo tuttavia è da sottolineare che la realizzazione ed esecuzione dei progetti spesso mostra notevoli rallentamenti. Questo è dimostrato dai dati relativi alla chiusura conti dei progetti. I motivi per il prolungarsi della realizzazione e chiusura conti dei progetti sono di varia

natura e sono stati più volte discussi in diverse sedute con gli enti competenti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e con altri GAL della provincia.

Dal punto di vista del gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina sono da considerarsi “critici” i seguenti fattori per una più efficace realizzazione del programma:

- Parziale **sostituzione degli attori politici e responsabili dei comuni dell'area** oggetto del sostegno nelle Valli di Tures ed Aurina in concomitanza con le votazioni comunali del maggio 2010: gli amministratori che sono susseguiti ai precedenti hanno richiesto maggior tempo per approfondire i contenuti, la normativa e la procedura consona del programma di sostegno Leader ed adattare i propri obiettivi e contenuti politici nei progetti spesso già iniziati o da iniziare. Questo in parte perché i progetti contenuti nel piano d'azione locale sono stati definiti a suo tempo dai “vecchi” amministratori comunali e quindi i nuovi hanno dovuto esaminarne a priori gli obiettivi, le priorità e le direttive riferite al finanziamento dei progetti.
- **Complessità ed ampio numero di normative e direttive** per la realizzazione dei progetti inerenti le misure 124 e 421: il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina, fino al 31.12.2010, non ha ricevuto alcuna proposta di progetto o delega per le misure sopra citate. In seguito a concreta richiesta agli attori e membri del gruppo d'azione locale sulle cause della mancata sottoposizione di progetti relativi alle misure elencate, le risposte hanno fatto costantemente riferimento all'alta complessità delle direttive per la riconoscibilità della legittimità del progetto. Questo dato è in contrasto con il principio di base del “bottom

– up” e dell’idea caratterizzante secondo la quale Leader è in grado di permettere la progettazione e la realizzazione di progetti dalle caratteristiche sperimentali.

- **Alto dispendio tecnico-amministrativo** nella progettazione ed esecuzione di iniziative da parte dei promotori pubblici: il dispendio burocratico e tecnico-amministrativo richiesto nella progettazione e realizzazione di progetti di scala più grande entro l’ambito della pubblica amministrazione richiede molto tempo e risorse, rallentando generalmente l’attuazione delle misure e dei progetti di ogni tipo (ad esempio i progetti della misura 322)
- **Mancanza di risorse finanziarie e abbassamento della liquidità** da parte di diversi promotori di progetti: da alcuni anni i promotori dei progetti – siano essi pubblici o privati – devono affrontare in modo crescente difficoltà finanziarie e una diminuzione di liquidità. Entrambi i fattori provocano la redistribuzione o l’eliminazione di alcuni punti di spesa previsti, influenzando negativamente l’esito finale e la realizzazione del progetto.

6) Modifiche al piano d’azione locale:

In seguito ad un’esaustiva relazione ed una approfondita valutazione delle possibilità di realizzazione, nonché preso atto

- che il gruppo di lavoro “Formaggio grigio” ha iniziato i lavori con 18 partecipanti, riuniti in un gruppo di contadini interessati (di cui 3 delle Valli di Tures ed Aurina), e che i lavori sono patrocinati dalla scuola professionale di Teodone dal 2009
- che il gruppo fino ad allora interessato al progetto “Offensiva della coltivazione di verdure e bacche” in Valle Aurina, il quale si interessava della coltivazione di erbe su vasta scala, ha comunicato in forma scritta la sua intenzione di ritirarsi dall’idea del progetto e che – in concomitanza con l’assessore provinciale Hans Berger – è possibile progettare un altro incontro a livello provinciale incentrato sull’azione comune “Colture intensive”

si provvede alla modifica del piano d’azione locale per le Valli di Tures ed Aurina, il quale è stato approvato con delibera nr. 3684 del 13.10.2008 attraverso la giunta provinciale di Bolzano, nel seguente modo:

Provvedimento	Piano d’azione locale valido fino ad ora				Nuovo piano d’azione locale			
	GAL VTA				GAL VTA (da confermare)			
	Costi	%	Contributo	Mezzi finanziari propri	Costi	%	Contributo	Mezzi finanziari propri
111 Informazioni, consulenze transfer	50.000,	100	50.000,00 €	0,00	0,00 €	100%	0,00 €	0,00 €

di conoscenze	00 €	%						
124 Prodotti di qualità LW coltivazione di erbe	250.00 0,00 €	80 %	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	80 %	0,00 €	0,00 €
313 A) Sentieri turistici agricoli con l'ente forestale	1.643.8 76,25 €	80 %	1.315.101,0 0 €	328.775,25 €	1.643.876,25 €	80 %	1.315.101,00 €	328.775,25 €
313 B) Risanamento malga	350.00 0,00 €	70 %	245.000,00 €	105.000,00 €	350.000,00 €	70%	245.000,00 €	105.000,00 €
313 C) Turismo rurale e mondo contadino / marketing	930.00 0,00 €	80 %	750.000,00 €	180.000,00 €	1.250.000,00 €	80 %	1.000.000,00 €	250.000,00 €
321 Biogas	625.00 0,00 €	80 %	500.000,00 €	125.000,00 €	625.000,00 €	80 %	500.000,00 €	125.000,00 €
322 Rinnovo paesano	1.875.0 00,00	80 %	1.500.000,0 0 €	375.000,00 €	1.875.000,00	80 %	1.500.000,00 €	375.000,00 €

421 Collaborazione transnazionale e sovranazionale	105.00 0,00 €	100 €	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	100 €	105.000,00 €	0,00 €
431 Amministrazione GAL – organizzazione	500.00 0,00 €	100 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100 €	500.000,00 €	0,00 €
Somma	6.328.8 76,25 €		5.165.101,0 0 €	1.163.775,25 €	6.328.876,25 €		5.165.101,00 €	1.163.775,25 €

7) L'amministrazione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (misura 431):

Il gruppo d'azione locale svolge un ruolo di primaria importanza a livello altoatesino nell'ambito dell'attuazione dell'asse Leader ed per il raggiungimento degli obbiettivi contemplati dal regolamento (CE) nr. 1698/2005, realizzando, come previsto, una efficace partnership tra pubblico e privato, grazie al principio del "bottom up" e della delega decisionale.

Poiché all'interno del programma è assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi coinvolti e rilevanti, si garantisce la partecipazione al programma di tutti i comuni e dei gruppi rilevanti ad esso connesso. I membri del gruppo d'azione locale riferiscono regolarmente ai loro organi in loco delle decisioni prese durante le sedute del gruppo d'azione locale e degli incontri di lavoro inerenti il Leader oppure veicolano le decisioni prese dai gruppi in loco all'interno del gruppo d'azione locale.

I rappresentanti del gruppo d'azione locale prendono così anche atto del loro dovere di informazione verso la rete di interessi locali, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione e alla presenza delle iniziative Leader dell'UE nel settore agricolo e nella periferia altoatesina.

La concreta organizzazione in loco:

L'ufficio insediato nel 2008 è sempre stato attivo nel 2010. I coordinatori, la dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera, hanno lavorato intensamente alla realizzazione del programma.

Una particolare attenzione è stata riservata all'accompagnamento e al sostegno dei promotori dei progetti. Strategicamente ci si è concentrati su un numero più ridotto di progetti, ma con la caratteristica della completezza. Pertanto il lavoro svolto si è spesso imbattuto in una maggiore complessità, a causa del maggiore impegno nella preparazione del progetto e nella disponibilità alla discussione con tutti gli attori coinvolti. Si può tuttavia presumere che l'adeguata preparazione e lo sviluppo di un rapporto dialettico con i promotori delle varie iniziative abbia portato ad una maggiore garanzia di ripetibilità del progetto e del risultato finale.

Gestione della sede di coordinamento Leader:

Anche nell'anno di riferimento la sede periferica di coordinamento – con eccezione dei giorni di ferie e festività – è rimasta aperta tutto l'anno, cinque giorni alla settimana. (orari d'apertura da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00).

L'ufficio Leader per le Valli di Tures ed Aurina ha la propria sede all'interno del municipio del comune di Campo Tures (39032 Campo Tures, via Municipio 8) e si è posto come compito primario quello di eseguire tutti i provvedimenti necessari per garantire lo sviluppo del programma Leader. Questi provvedimenti comprendono: invito e coordinamento dei gruppi, stesura dei rapporti, management dei documenti, centro di informazione e consulenza per la popolazione e i promotori dei progetti, ente di collegamento tra il gruppo d'azione locale e gli enti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, pubbliche relazioni e ufficio stampa, management amministrativo, progettazione, realizzazione e accompagnamento amministrativo dei progetti Leader, il cui patrocinio è affidato alla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina nella funzione di piattaforma operativa portante, ecc.

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale Valle di Tures ed Aurina nella funzione di piattaforma operativa portante:

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina, il 31.01.2002, ha fondato la Cooperativa per lo Sviluppo Regionale e la formazione professionale Valli di Tures ed Aurina (registrazione camera di commercio nr. 169456 del 15.03.2002), allo scopo di realizzare i provvedimenti Leader ed i compiti concordati nei programmi con l'ausilio di una piattaforma operativa portante e centrale. Diversi progetti Leader del programma 2007 – 2013 sono stati delegati dal GAL Valli di Tures ed Aurina alla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale. In tale contesto si contano in prima linea progetti delegati sulla base della misura 431, nonché altri progetti basanti sulla misura 313 C (vedi lista dei progetti delegati a pagina 5 del presente rapporto). In questi progetti l'attività della sede di coordinamento Leader va ben oltre la mera consulenza o informazione, comprendendo anche la gestione completa del progetto in ambito tecnico-amministrativo, nonché lo svolgimento delle questioni finanziarie.

Management dei documenti:

Il gruppo d'azione locale custodisce i documenti correlati ai progetti dalla data di inoltro della richiesta del progetto stesso fino al saldo conclusivo e la liquidazione del contributo erogato. Con esso si comprendono tutti i moduli progettuali necessari, nonché le fatturazioni specifiche per i progetti, la documentazione contabile ed i registri, i verbali ed i rapporti e l'intera corrispondenza con gli attori e soggetti agevolati dei progetti, membri del GAL ed enti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Compiti di coordinamento:

Per la realizzazione operativa degli obiettivi programmatici il gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina ha stipulato contratti a tempo determinato con i coordinatori dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera. I contratti prevedono il sistematico svolgimento e la realizzazione dei progetti inoltrati dai promotori, il loro accompagnamento e la loro assistenza, la redazione di verbali ed il coordinamento, gestione dei progetti stessi; i gruppi vengono accompagnati dai coordinatori ai sensi dell'approccio "bottom up" previsto e perseguito, mentre gli attori sono sostenuti nell'organizzazione, sia tecnica che strategica,

durante la fase di realizzazione del concreto provvedimento previsto. La fase esecutiva tuttavia è lasciata agli attori stessi. Il tutto per sostenere il principio cardine dello sviluppo e del rafforzamento delle competenze conoscitive nell'area.

I coordinatori hanno il compito di assistere tecnicamente la preparazione delle sedute, la redazione dei verbali e dei necessari rapporti, affiancando il presidente del gruppo d'azione locale nel coordinamento. Essi forniscono inoltre i servizi tecnici aggiuntivi.

Svolgimento dello sviluppo, dell'inoltro e della delibera progettuale:

Mentre l'ufficio prende in consegna i progetti inoltrati, fornendo alle persone interessate le prime informazioni e consulenze, il compito dei coordinatori si concentra sull'accompagnamento dei promotori dei progetti, aiutandoli nella formulazione e compilazione dei moduli necessari. I coordinatori realizzano, secondo un apposito iter, una valutazione tecnica dei progetti depositati da presentare formalmente alla prossima seduta del gruppo d'azione locale. La valutazione è parte integrante della documentazione dei progetti da sottoporre alla valutazione del gruppo d'azione locale. Poiché la decisione formale sui progetti all'interno del programma leader sottostà alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, ovvero la facoltà di sostenere la decisione sui contenuti e l'attribuzione finanziaria richiesta dal gruppo d'azione locale attraverso il controllo amministrativo e l'attribuzione finanziaria (decreto della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige) tramite le direzioni provinciali, il gruppo d'azione locale raccoglie la seguente documentazione per i progetti approvati:

- modulo di proposta del gruppo d'azione locale con documentazione richiesta, modulo d'approvazione del gruppo d'azione locale, dichiarazione sui costi di finanziamento residui, preventivo dettagliato, relazione tecnica, valutazione di coerenza sulla strategia Leader, richiesta di finanziamento Leader (modulo della Provincia), verbale d'approvazione della corrispettiva seduta del gruppo d'azione locale.

In seguito alla delega attraverso il gruppo d'azione locale le domande di progetto vengono inoltrate all'ente di supporto della Provincia di Bolzano – Alto Adige per l'esame, la valutazione e la delibera. L'ente emette il decreto controfirmato dall'assessore provinciale competente per l'attribuzione finanziaria vincolante ed il progetto può passare alla fase operativa.

Informazioni alla popolazione:

Per garantire un'informazione adeguata alla popolazione locale, nel 2010 il gruppo d'azione ha utilizzato i seguenti provvedimenti:


a) la comunicazione dei provvedimenti Leader intrapresi nei rispettivi giornali comunali, distribuiti in tutti i domicili dei comuni coinvolti

- 12/2010 Tauernfenster (bollettino informativo del Comune di Predoi)

- 09/2010 Bollettino informativo del comune di Valle Aurina

- 01/2010 Taufra Bötl (bollettino informativo del comune di Campo Tures)

b) la gestione e cura di un sito internet all'indirizzo www.leader-tat.com come sito proprio;

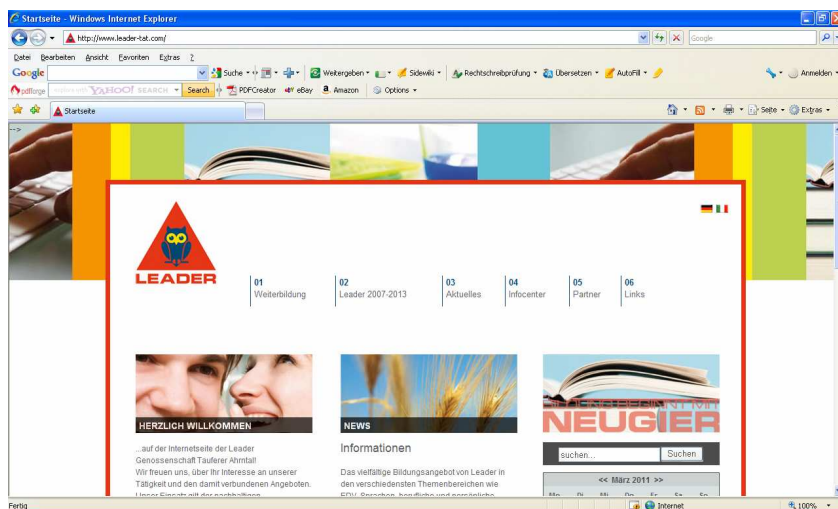

c) ulteriori efficaci pubblicazioni allo scopo di raggiungere l'opinione pubblica in concomitanza con diversi progetti:

- „Do Puschtra“ edizione 23 del 25.11.2010 (Titolo dell'articolo: Bauernland-Zwerge)
- „Do Puschtra“ edizione 14 del 08.07.2010 (Titolo dell'articolo: Ahrntaler Graukäse)
- „Do Puschtra“ edizione 14 del 08.07.2010 (Titolo dell'articolo: Bauernland-Zwerge)
- Quotidiano „Dolomiten“ del 23.06.2010 (Titolo dell'articolo: Bauernland-Zwerge)
- Quotidiano „Die neue Südtiroler Tageszeitung“ del 24.06.2010

(Titolo dell'articolo: Bauernland-Zwerge)

- Quotidiano „Dolomiten“ del 22.06.2010 (Titolo dell'articolo: Ahrntaler Graukäse)
- „Do Puschtra“ giugno 2010 (Titolo dell'articolo: Käse-Geschichten)
- „Do Puschtra“ giugno 2010 (Titolo dell'articolo: Magie des Wassers)
- Quotidiano „Dolomiten“ del 08.06.2010 (Titolo dell'articolo: Magie des Wassers)
- Quotidiano „Dolomiten“ del 26.03.2010

(Titolo dell'articolo: Wasser und bäuerliche Welt waren Thema)

- Quotidiano „Dolomiten“ del 17.02.2010 (Titolo dell'articolo: Kulturell und menschlich wertvoll).

Collaborazione con altre aree leader nell'ambito della Rete Rurale Nazionale (RNN) e altri GAL:

Nel 2010 abbiamo partecipato attivamente a diverse attività della rete. Il 05/03/2010 abbiamo partecipato al seminario della Rete Rurale Nazionale svoltosi a Roma, dove è stato trattato il tema Leader e Agenda21 e altre tematiche incentrate sulla sostenibilità dello sviluppo in ambito agricolo.

Il 13 e 14 aprile 2010 abbiamo partecipato ad un incontro preparatorio per il progetto "Terre Ospitali" a Brà, organizzato nell'ambito della cooperazione infrateritoriale (misura 421) insieme ad altri GAL. Ne è seguito un altro incontro svoltosi il 9 luglio 2010 a Roma.

Il 28 e il 29.05.2010 il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha partecipato alla fiera "Futura", in cui il dr. Pingera ha tenuto un seminario sui progetti sostenibili nello sviluppo regionale.

Il 14.06.2010 abbiamo sviluppato per la Rete Rurale Nazionale 2 "schede di progetto", mostrate nell'ambito di una presentazione internazionale.

Il 23 e il 24.11.2010 abbiamo partecipato, insieme ai coordinatori del GAL Sarentino e GAL Val'd'Ultimo – Deutschnonsberg, presso Bad Ischl, all'incontro annuale dei gruppi Leader austriaci.

Dal 12.11 al 01.12.2010 abbiamo potuto ospitare nel nostro territorio un gruppo di studio di ARSIA Toscana con animatori Leader.

Collaborazione con gli uffici provinciali e l'ufficio fondi strutturali UE in agricoltura:

Una delegazione del GAL ha partecipato alla seduta organizzata dall'ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, la quale si è svolta il 31.05.2010 in sede preparatoria ed il 03.06.2010 con la seduta del Comitato di Sorveglianza a Bolzano. Qui si è discusso e chiarito l'andamento generale e lo stato d'avanzamento del programma, i dettagli nella gestione del gruppo d'azione locale e del programma Leader.

I coordinatori:

Dr. Helmut Pinggera

Dr.ssa Miriam Rieder

Il presidente:

Sindaco Helmuth Innerbichler

Campo Tures, lì 27 marzo 2011
